INFORME DE AVANCE · COMITÉ SPONSOR GRECO


SAML

Sistema Automatizado de Monitoreo de Licitaciones

Dónde estamos, qué nos puede frenar y qué necesitamos decidir hoy.

Samuel Villa · Cristóbal Rodríguez · Juan José Botero
Emanuel Castañeda · Samuel Deossa

13 · 10 · 2026 — SI4008 · UNIVERSIDAD EAFIT

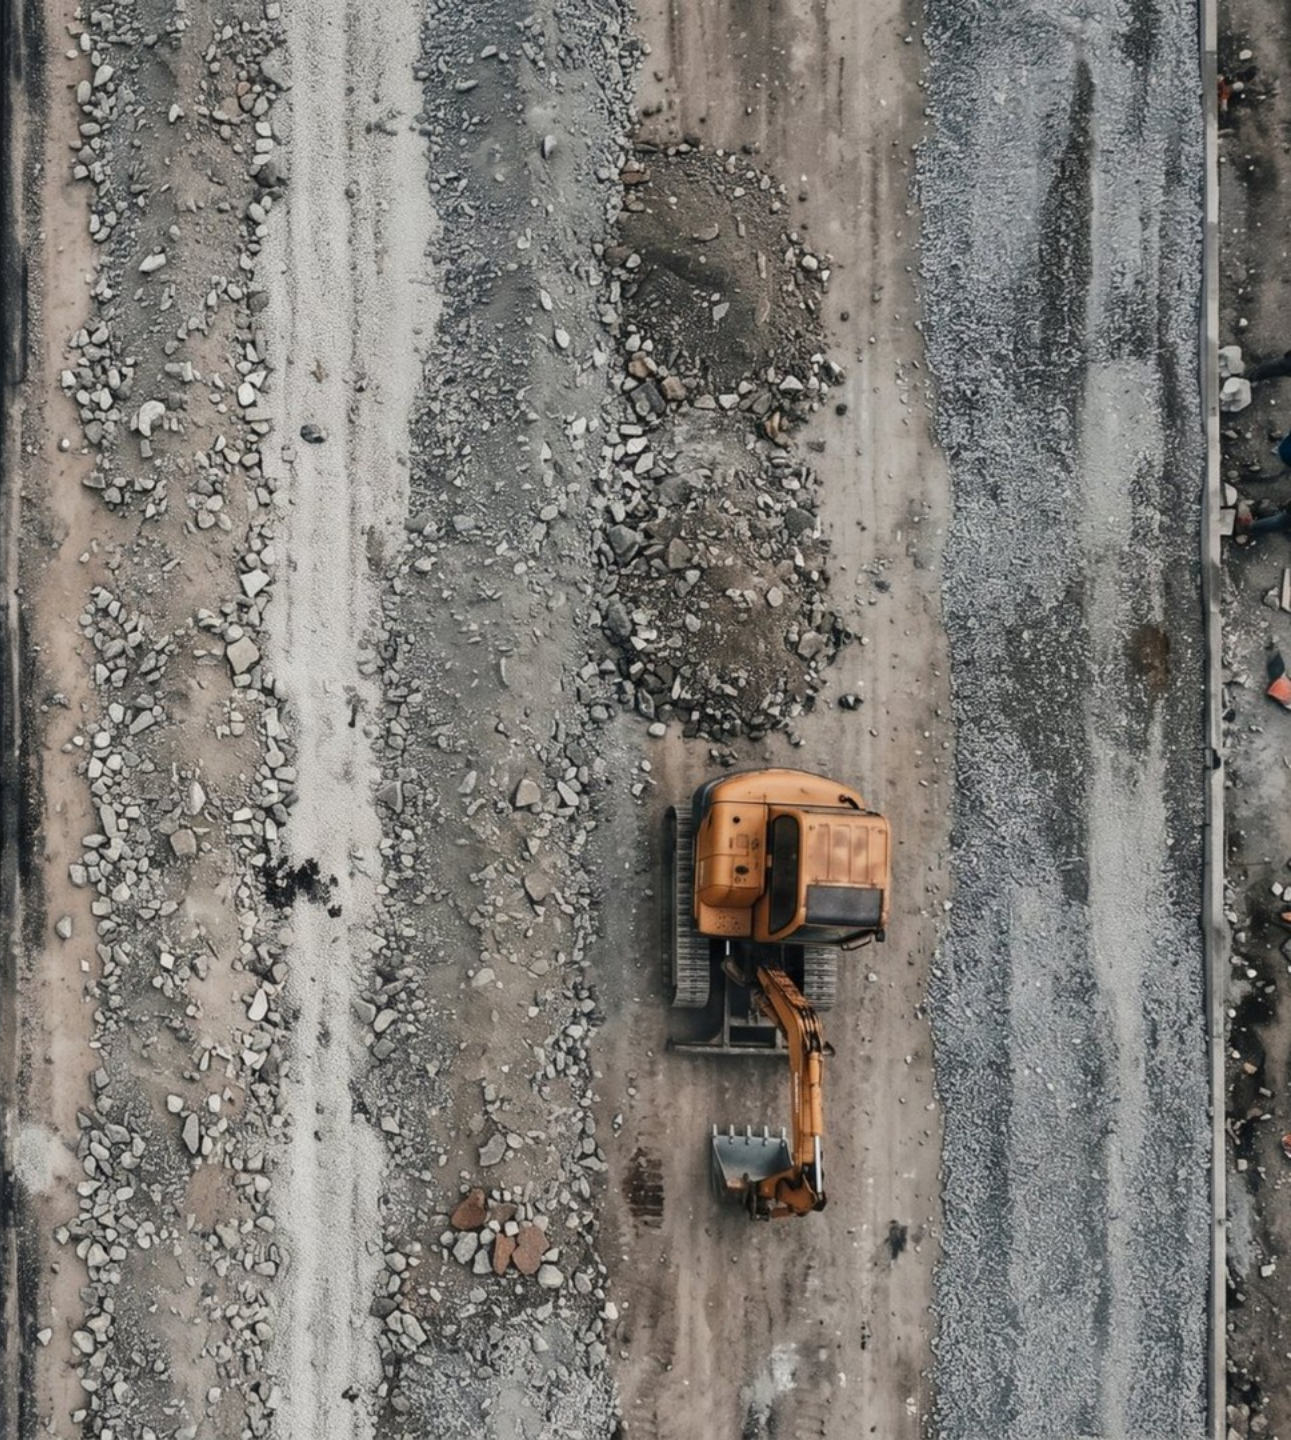

La extracción ya funciona. El calendario, no.

Un clic trae, limpia y verifica las licitaciones adjudicadas. Pero el motor de limpieza llegó tarde, arrastró dos hitos y dejó en riesgo el piloto con el equipo comercial.

4 de 8

hito en curso; el 3 y el 4 siguen a medias

+20 días


de atraso del motor de limpieza, en la ruta crítica

4

decisiones que le pedimos hoy al comité

Fuente: repositorio SAML (commits del 08-10 y 12-10) y cronograma del Anexo C.

El motor de limpieza llegó 20 días tarde y dejó abiertos los hitos 3 y 4

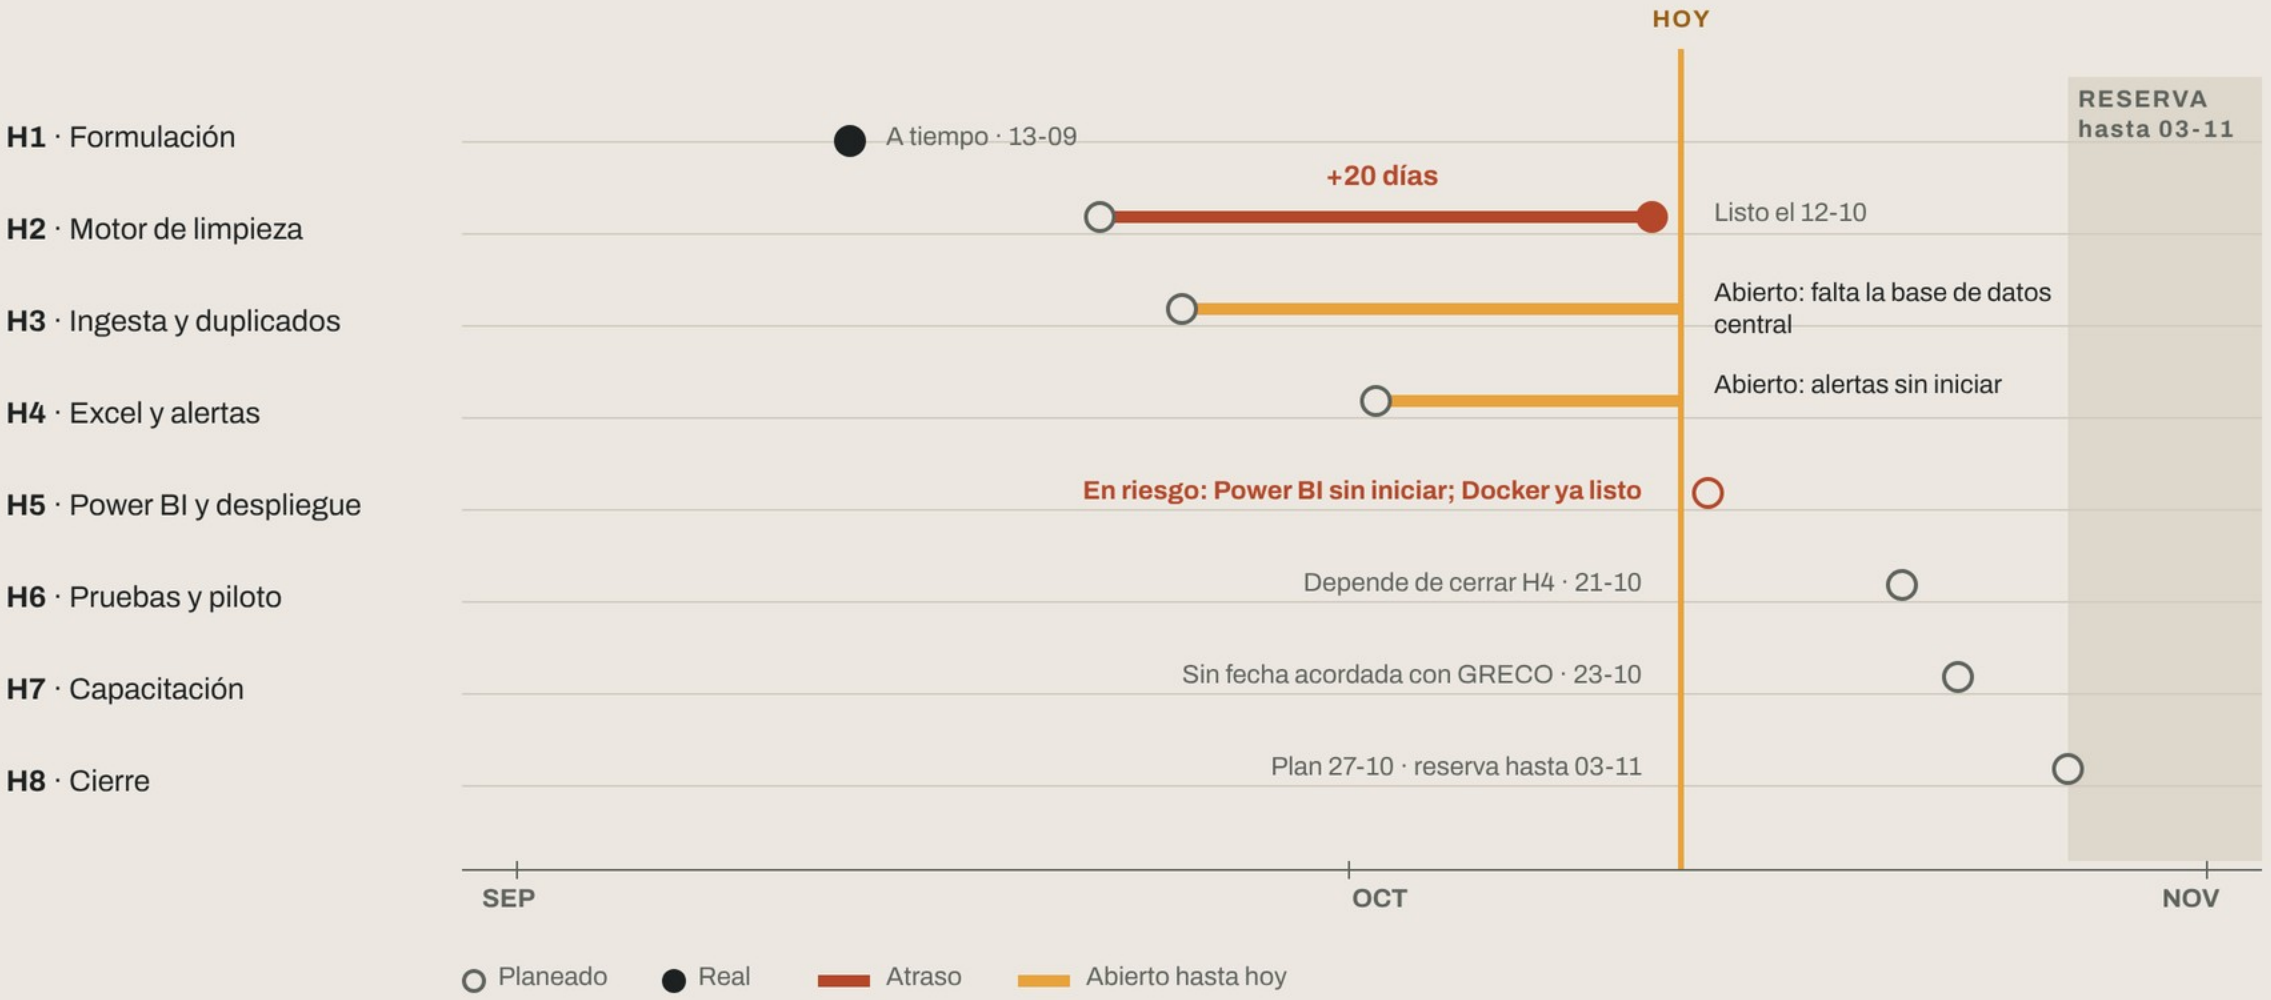

Fuente: cronograma de hitos y repositorio SAML

Localidad, NIT y fecha de adjudicación no existen en la fuente pública

3/20

columnas de Obras V6 que el sistema puede llenar hoy con datos públicos.


Las 7 sin fuente incluyen la que usan para asignar el asesor: **localidad**.

Entidad	**Valor en millones**	**Empresa ganadora**	**NIT**
Localidad	**Latitud**	**Longitud**	**Nombre de la obra**
Contrato No.	**Fecha de adjudicación**	Asesor	Despacho / disposición
Contactada	Notas	Avance %	Meses por terminar
Valor por ejecutar	Potencial infraestructura	Meta 25 % material	MS Greco

3 · las llena SAML · 7 · sin fuente pública · 4 · del asesor · 6 · fórmulas de Obras V6

Fuente: mapeo de columnas de Obras V6, repositorio SAML (Transformacion/README.md).

Los dos riesgos nuevos están entre los más altos y solo el comité puede resolverlos

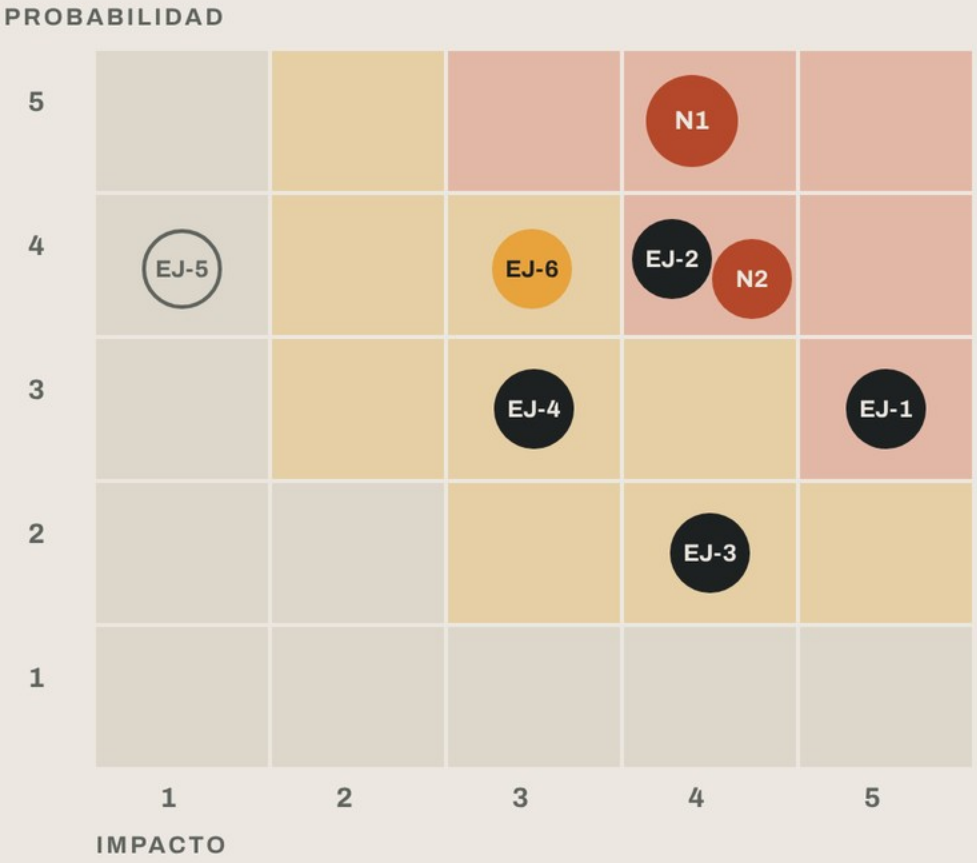

N1 · 20	**Campos sin fuente pública.** Ya ocurrió. Decide el comité quién completa localidad, NIT y fecha.
N2 · 16	**Atraso del cronograma.** Sin reajuste de alcance o fecha, el piloto no alcanza.
EJ-2 · 16	**Datos con errores en la fuente.** Mitigado: la limpieza está lista y todo dato dudoso queda registrado.
EJ-1 · 15	**Caída de la API.** 4 semanas de seguimiento sin un solo incidente (21-09 a 11-10).
EJ-4 · 9	**Baja adopción comercial.** Sin cambios: la capacitación todavía no tiene fecha.

N1 y N2: propuestos por el equipo, pendientes de registrar. EJ-5 (CRM) cerrado. EJ-6 (Docker) es una oportunidad ya aprovechada. Fuente: registro de riesgos, 13-10.

Cuatro decisiones de alcance ya simplificaron el sistema

28 ago

De revisar 4 portales a una sola API

Datos ordenados que no se rompen cuando una página web cambia.

27 sep

Criterios de interés acordados con el PO

Solo llegan procesos adjudicados que le sirven a GRECO.

30 sep

Se descarta la integración con el CRM

No hubo acceso a su API a tiempo. La información llega en Excel.

12 oct

Un Excel aparte, no sobre Obras V6

Protege su archivo de control hasta validar las columnas con el original.

Ninguna de las cuatro ha movido todavía la fecha de cierre. La siguiente sí puede hacerlo.

Fuente: formulación (versiones 3.0 y 3.1), registro de riesgos (EJ-3, EJ-5) y repositorio SAML.

ESTA SEMANA

Para cerrar el 3 de noviembre necesitamos cuatro decisiones

Cada una tiene una fecha límite y un costo si no se toma.

1 **Compartir el archivo Obras V6 original** — Antes del 15-10

Si no: seguimos con columnas tomadas de una captura y no podemos anexar filas a su archivo.

2 **Definir quién completa localidad, NIT y fecha** — Antes del 15-10

Recomendamos que el asesor las complete durante el piloto. Si no: la asignación por zona sigue manual.

3 **Aprobar el reajuste: alertas y ejecución diaria primero, Power BI después** — Hoy

Piloto del 20 al 27-10 y cierre el 03-11, dentro de la reserva. Si no: el piloto no alcanza.

4 **Designar responsable de operación y fecha de capacitación** — Antes del 16-10

Si no: no hay a quién transferir la solución al cierre.



DEL ESCOMBRO AL DATO

Lo que GRECO hace con el escombro, SAML lo hace con la información.

Gracias.

La extracción ya funciona. Con las cuatro decisiones de hoy, el equipo comercial la recibe a tiempo.

¿Preguntas?

github.com/svillav4/SAML
